


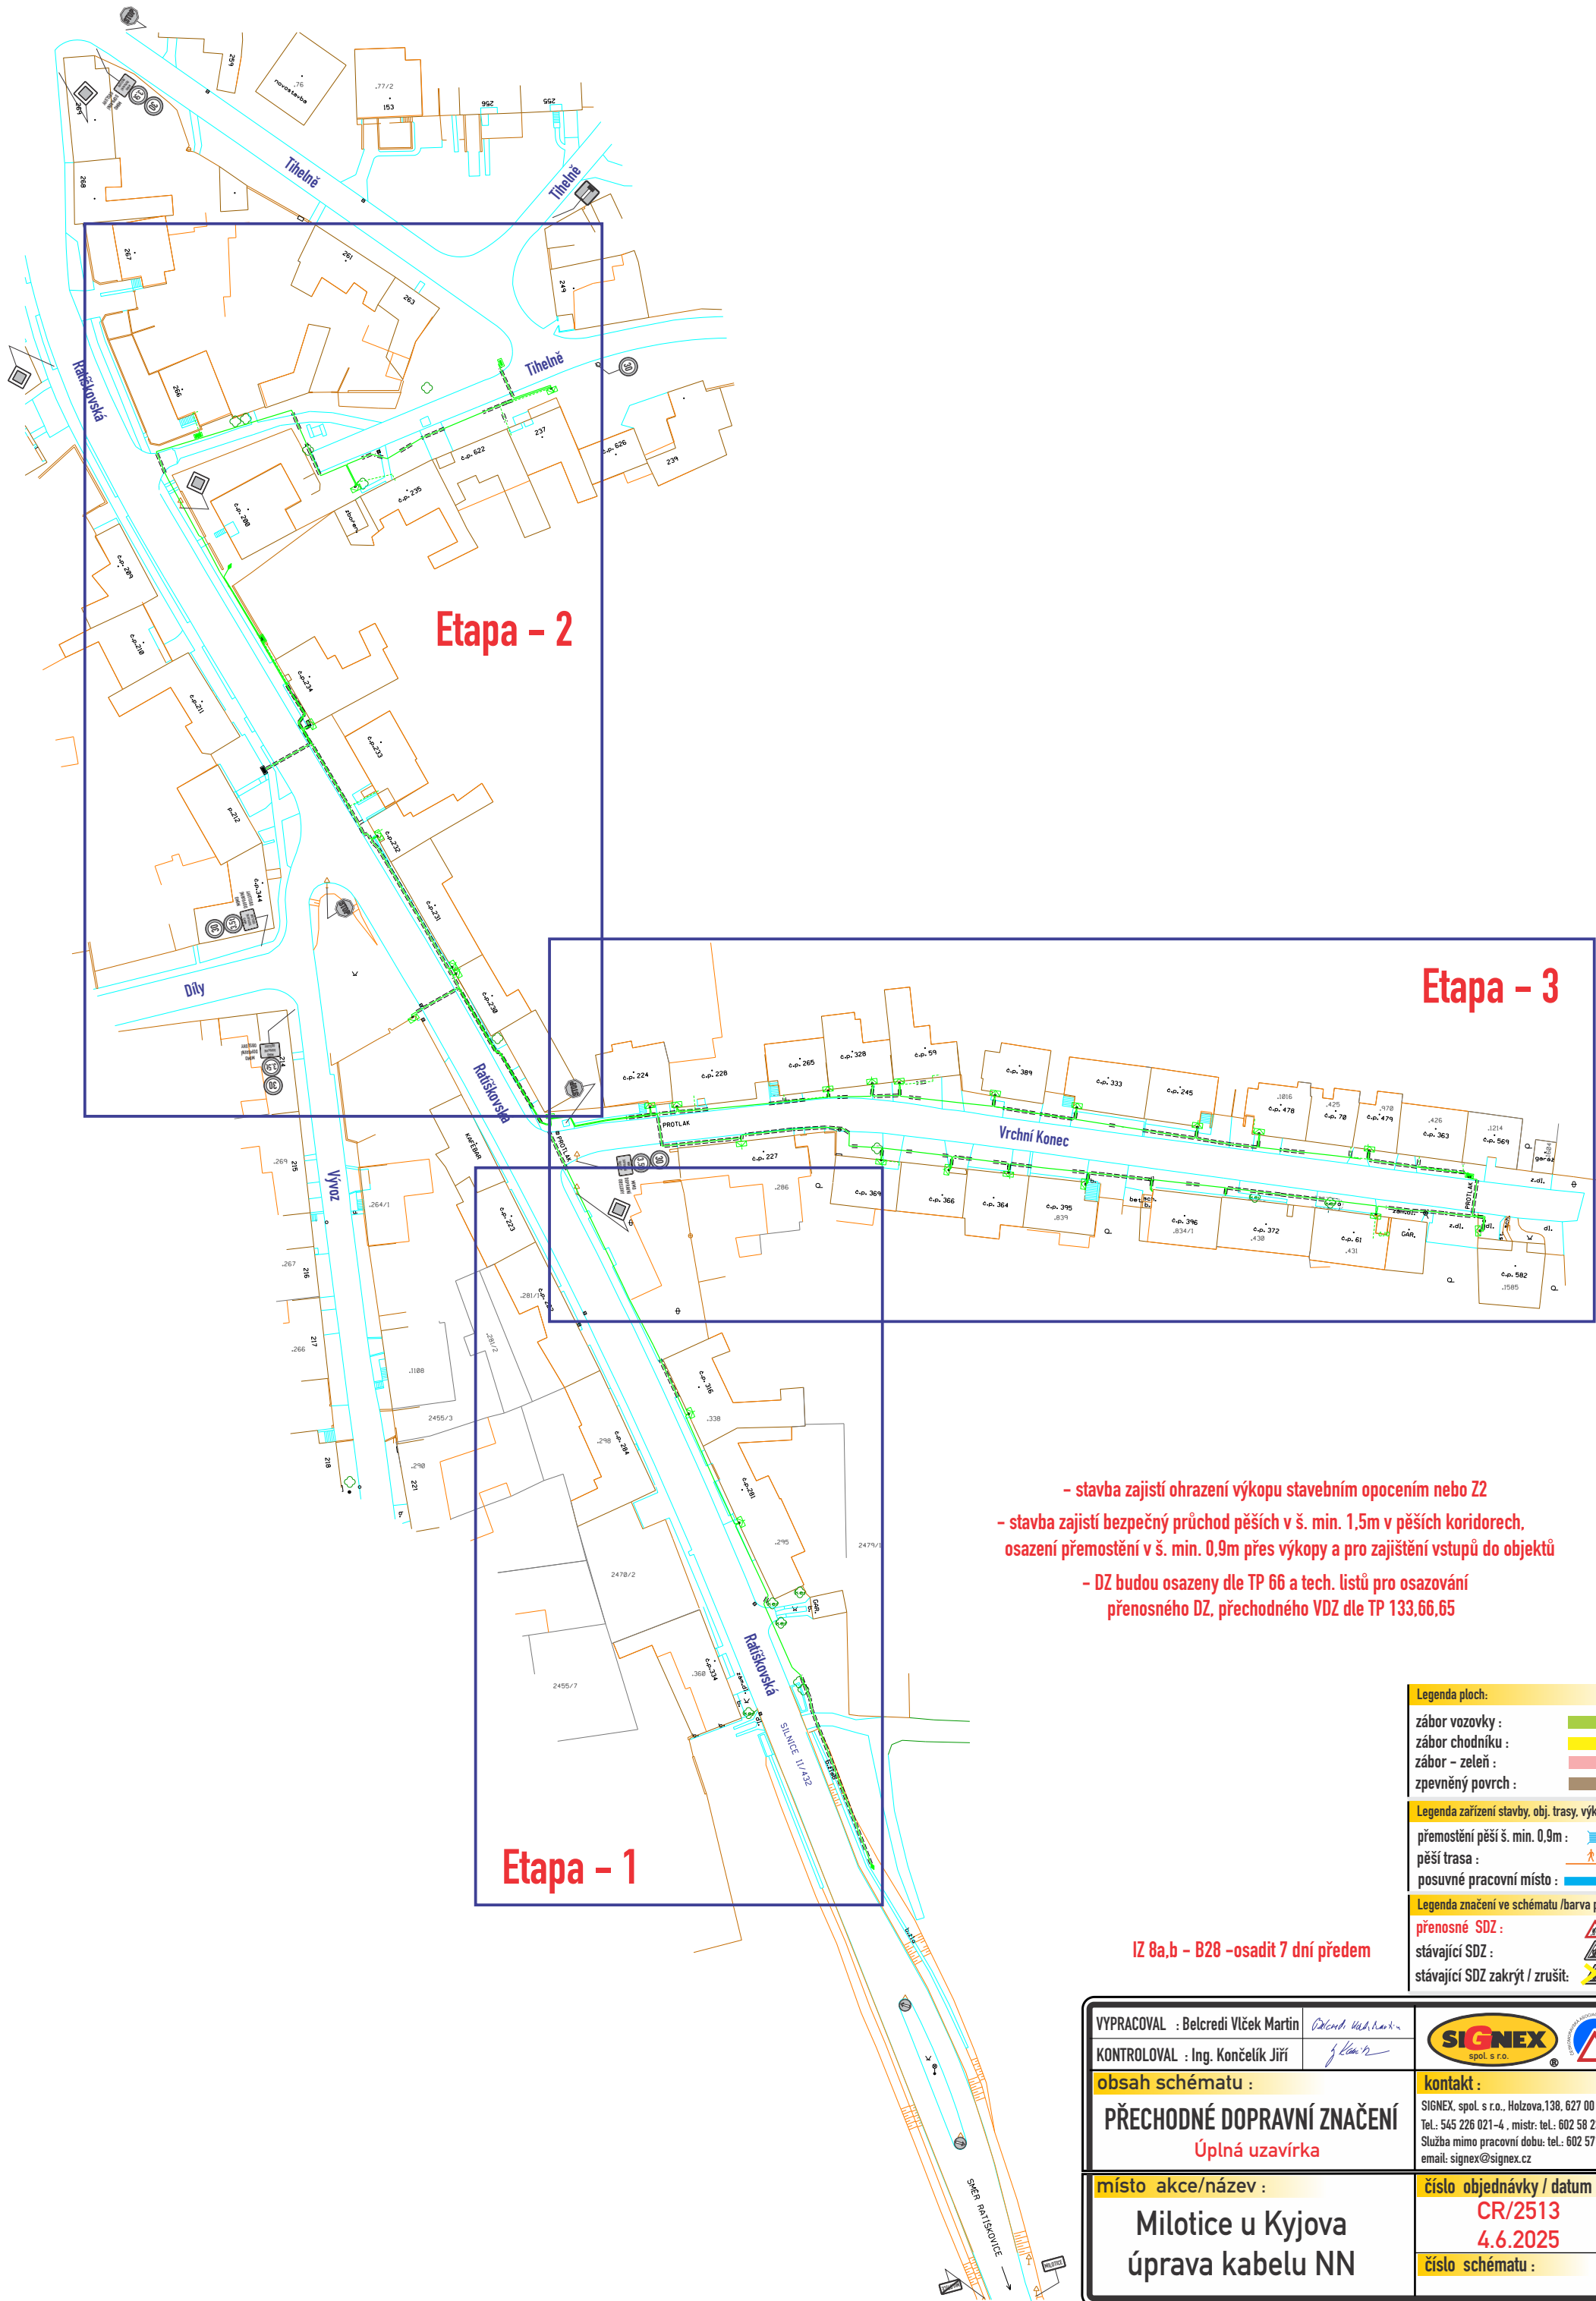

- stavba zajistí ohrazení výkopu stavebním opocněním nebo Z2
- stavba zajistí bezpečný průchod pěších v š. min. 1,5m v pěších koridorech, osazení přemostění v š. min. 0,9m přes výkopy a pro zajištění vstupů do objektů
- DZ budou osazeny dle TP 66 a tech. listů pro osazování přenosného DZ, přechodného VDZ dle TP 133,66,65

Legenda ploch:

- záběr vozovky :
- záběr chodníku :
- záběr - zeleň :
- zpevněný povrch :

Legenda zařízení stavby, obj. trasy, výkopy :


- přemostění pěší š. min. 0,9m :
- pěší trasa :
- posuvné pracovní místo :

Legenda značení ve schématu /barva popisu :

- přenosné SDZ :
- stávající SDZ :
- stávající SDZ zakrýt / zrušit :

IZ 8a,b - B28 -osadit 7 dní předem

VYPRACOVAL : Belcredi Vlček Martin		
KONTROLOVAL : Ing. Končelík Jiří		
obsah schématu :	kontakt : SIGNEX, spol. s r.o., Holzova,138, 627 00 Brno Tel.: 545 226 021-4 , mistr: tel.: 602 58 23 25 Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312 email: signex@signex.cz	
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Úplná uzavírka	číslo objednávky / datum : CR/2513 4.6.2025	
místo akce/název : Miletice u Kyjova úprava kabelu NN	číslo schématu : 1	

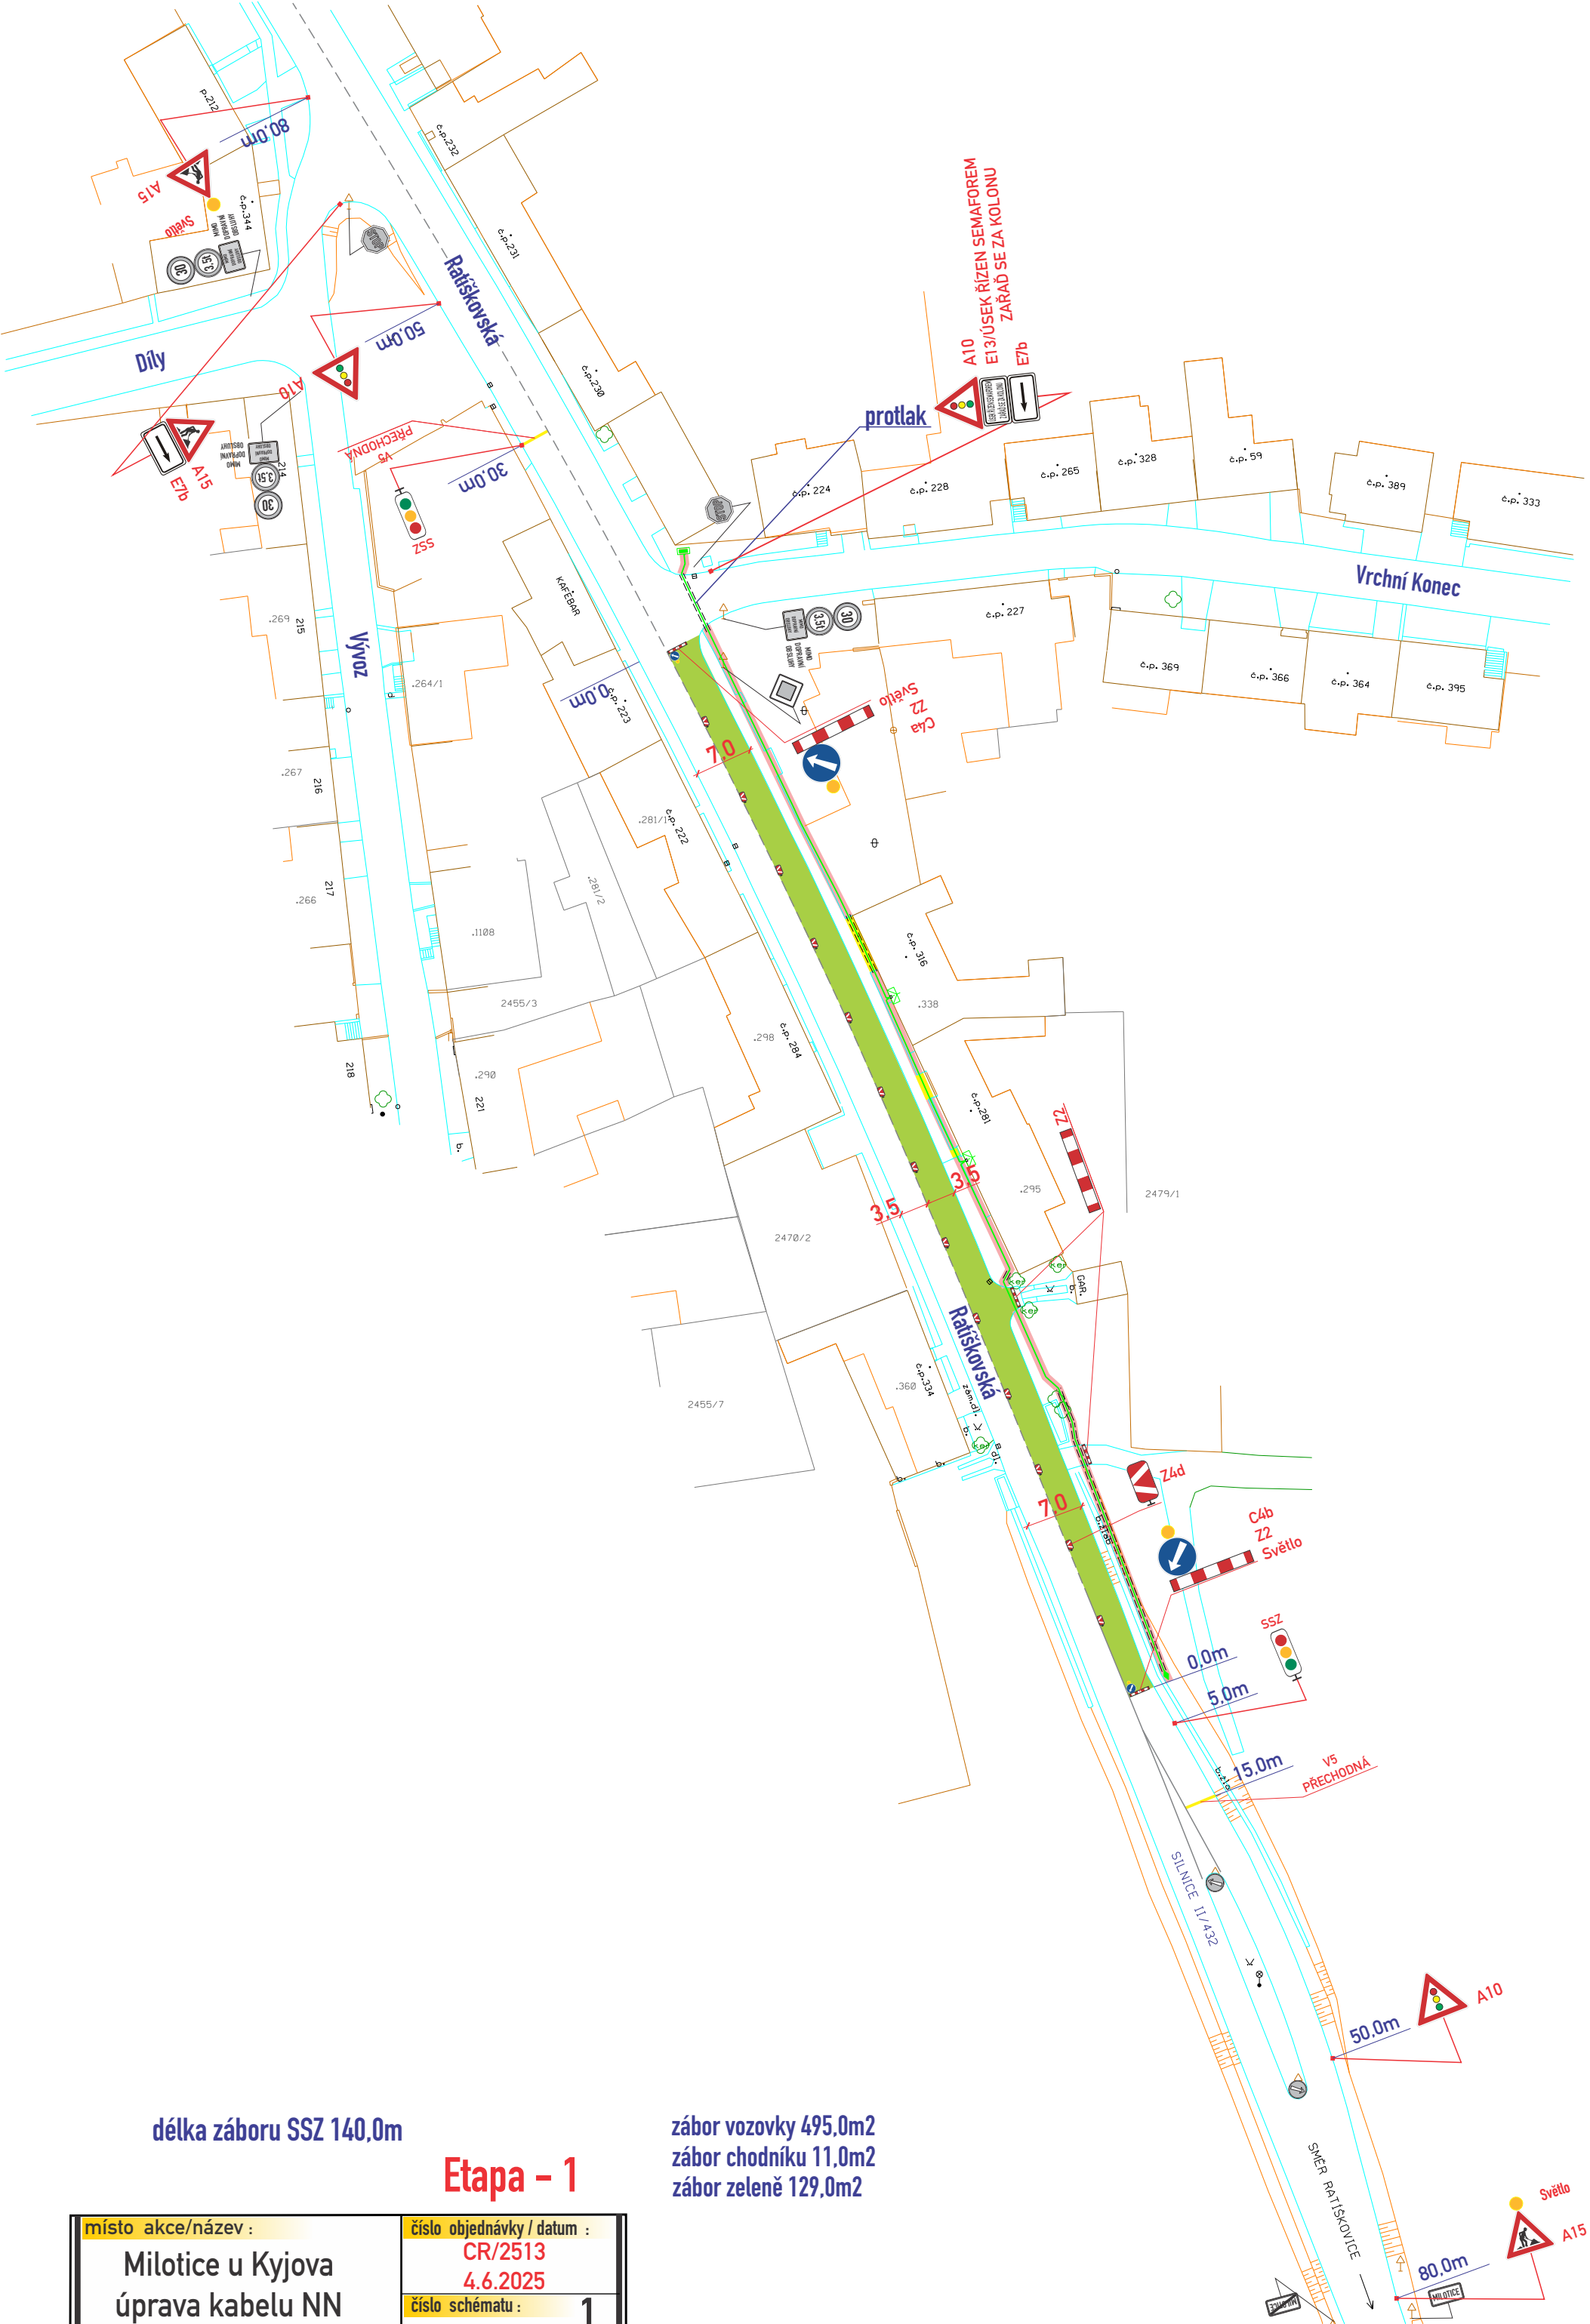

délka záboru SSZ 140,0m

Etapu - 1

zábor vozovky 495,0m²
zábor chodníku 11,0m²
zábor zeleně 129,0m²

místo akce/název :	číslo objednávky / datum :
Milotice u Kyjova	CR/2513
úprava kabelu NN	4.6.2025
číslo schématu :	1

